

愛知県汚水処理の広域化・共同化計画の進捗状況（令和5年度）

令和5年度の進捗状況を以下のとおりまとめた。

表：愛知県汚水処理の広域化・共同化計画の令和5年度進捗状況

事業種別		未着手	検討開始	合意形成	事業着手	事業開始	小計	合計
下水道施設の統廃合	短期	0	0	0	2	0	2	9
	中期	0	0	0	1	0	1	
	長期	1	2	0	3	0	6	
農業集落排水施設の統廃合	短期	0	0	1	6	2	9	74
	中期	0	0	15	1	0	16	
	長期	39	1	9	0	0	49	
コミュニティプラント施設の統廃合	短期	0	0	1	0	0	1	17
	中期	1	0	7	0	0	8	
	長期	3	3	2	0	0	8	
他処理区への編入	短期	0	0	0	0	1	1	2
	中期	0	0	0	0	0	0	
	長期	1	0	0	0	0	1	
汚泥処理の共同化	短期	0	0	0	1	2	3	3
	中期	0	0	0	0	0	0	
	長期	0	0	0	0	0	0	
し尿処理施設の統廃合・接続	短期	0	0	0	1	2	3	5 ※
	中期	1	1	0	0	0	2	
	長期	0	0	0	0	0	0	
ソフトメニュー	短期	0	0	1	3	10	14	14
	中期	0	0	0	0	0	0	
	長期	0	0	0	0	0	0	
合計	短期	0	0	3	13	17	33	124
	中期	2	1	22	2	0	27	
	長期	44	6	11	3	0	64	

※ し尿処理施設統廃合 メニュー数2、施設数3(内、統廃合済施設2、未着手施設1)


し尿処理施設接続 メニュー数3、施設数3(内、接続済施設1、建設中施設1、基礎調査施設1)

短期（計画策定から5年程度で実施するメニュー）

中期（計画策定から10年程度で実施するメニュー）

長期（概ね20年～30年かけて実施するメニュー）

ソフトメニュー：維持管理業務の共同化、下水道事務等共同化、災害訓練等の共同化、人材育成の共同化 等

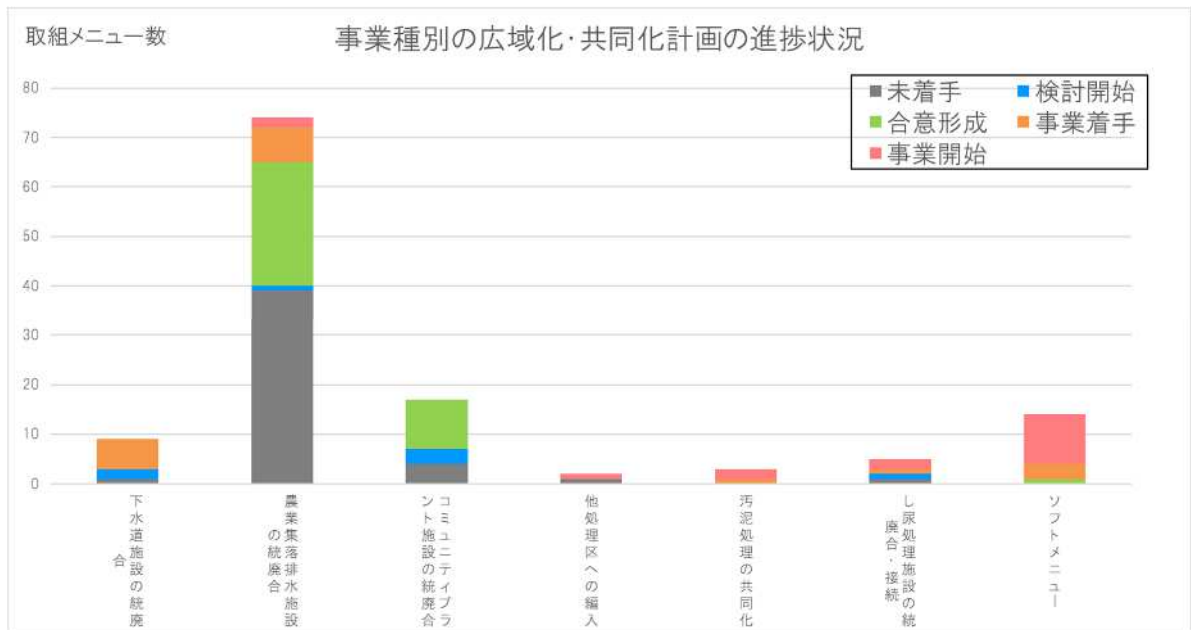

図：愛知県汚水処理の広域化・共同化計画の令和5年度進捗状況

全124の取組みの内、17の取組みが事業（供用）開始した。事業開始に至っていないものの、「短期（概ね5年以内）」として計画に位置付けられた取組は概ね事業着手まで進んでおり、引き続き早期の供用開始に向けて進める。

また、現在未着手である取組みの多くは「長期的な方針（概ね20～30年）」として計画に位置付けられたものであるため、今後適時検討を進めていく。
