

2024年6月3日（月）
愛知県防災安全局防災部
防災危機管理課防災拠点推進室
計画グループ
担 当 黒原、杉浦
内 線 5450、2524
ダイヤル 052-954-7478

「愛知県基幹的広域防災拠点」の整備を推進します

愛知県では、大規模災害時に、全国からの応援人員や物資等を円滑に受け入れ、被災現場や地域の防災拠点に迅速かつ的確に供給する「愛知県基幹的広域防災拠点」の整備を進めています。

「愛知県基幹的広域防災拠点」の整備・運営の手法については、民間の知恵、ノウハウを最大限に取り入れることができるPFI法[※]に基づくBTコンセッション方式により整備を進めることとし、2023年7月7日に実施方針を公表、10月20日に公告を行い事業者の選定手続を進めていきましたが、2024年3月29日の入札の結果、予定価格の範囲内に至らず、不落となりました（2024年4月3日県ホームページにて公表）。

この度、防災拠点の早期整備に向けて、事業者の幅広い参加を促し、競争性を確保できる事業手法及び事業単位を検討するため、民間事業者へ幅広くヒアリングを実施し、消防学校と防災公園をそれぞれ単位として事業を進めることとしました。

第1期として、防災拠点の中核施設である消防学校の整備をBT方式により実施することとし、アドバイザー契約を締結の上、事業者の選定手続を進めていきます。

なお、第2期となる防災公園の整備に向けては引き続き、民間事業者へのヒアリングを継続し、市場環境を踏まえた適切な事業手法を選択できるよう迅速に作業を進めます。

※PFI法：民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

○ 事業内容

防災拠点の中核施設である消防学校の整備及び運営を行うため、アドバイザー契約を締結し、事業者の選定手続を進める。

【整備対象施設】

消防学校（敷地面積：約6.1ha）

災害時に防災拠点の本部機能を担い、平常時には県内消防職員等の育成を担う施設

※第2期となる防災公園の整備に向けては引き続き、民間事業者のヒアリングを継続し、適切な事業手法を選択できるよう迅速に作業を進める。

【事業方式】

BT方式・サービス購入型

○ 今後のスケジュール（予定）

◎2024年7月～11月頃 事業費の検証、マーケットサウンディング

これまでのスケジュールと今後のスケジュールについては、別紙2を参照してください。
なお、詳細な事業経過等は以下の県防災危機管理課防災拠点推進室 Web ページを参照してください。

<https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bosai-kyoten/>

愛知県基幹的広域防災拠点整備等事業について

① 愛知県基幹的広域防災拠点とは

災害時における拠点指揮運用機能を確保するとともに、緊急消防援助隊、自衛隊等のベースキャンプ用地や、支援物資の受け入れ、県内全域への供給に必要な物資ターミナルを設けることにより県内全域の災害応急活動を後方支援する機能を確保する。

平常時は消防学校と公園として利用する。消防学校では、消防職員等育成の他、地域の防災教育・人材育成等に活用し、公園では、運動施設等の他、イベント開催、防災ビジネス等に活用する。

② 拠点概要


- 整備場所
豊山町青山地区
- 規模
防災拠点区域：19.2ha

③ 整備進捗状況

- 用地買収：2024年3月末までに約94%の土地について売買契約を締結済み。
- 敷地造成：用地取得が完了した箇所から順次敷地造成工事に着手しており、2024年3月までに約23%の造成が完了済み。
- 調整池工事：2024年2月から工事着手済み。
(その他河川工事として、大山川洪水調節池工事に2023年8月から着手済み。)

④ 整備対象施設・事業方式

- 第1期
【整備対象施設】
消防学校（敷地面積：約6.1ha 右図、赤枠のとおり）
・災害時に防災拠点の本部機能を担い、平常時には県内消防職員等の育成を担う施設
- 【事業方式】
BTO方式・サービス購入型
・施設の設計・建設後、県に施設の所有権を移転し、施設の維持管理を行う。
(Build Transfer Operate)
・民間事業者は、自ら調達した資金により施設の設計・建設、維持管理を行い、県は、そのサービスの提供に対して対価を支払う(サービス購入型)。
- 第2期
・第2期となる防災公園の整備に向けては引き続き、民間事業者のヒアリングを継続し、適切な事業手法を選択できるよう迅速に作業を進める。

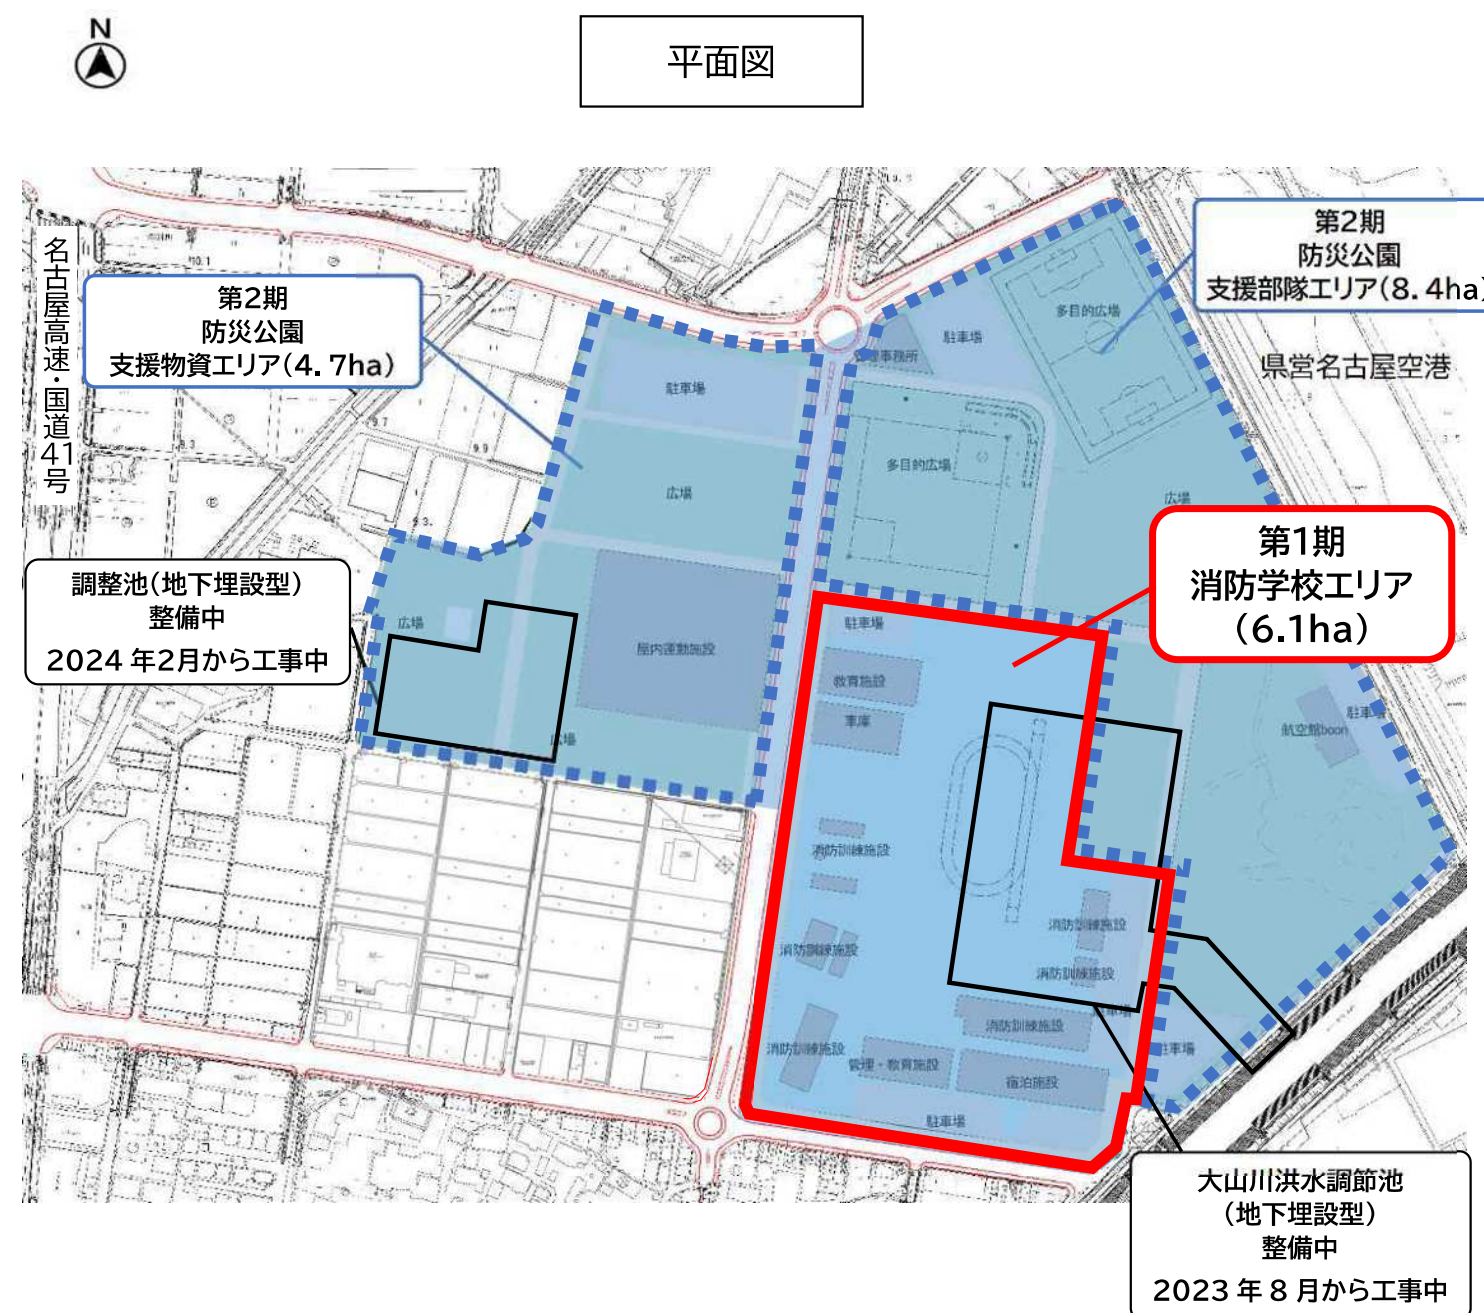

愛知県基幹的広域防災拠点整備等事業に係る整備スケジュールについて

	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度
これまでのスケジュール	<p>◆[令和5年6月議会] 補正予算議案(債務負担行為)の承認 整備費 21,440,006 千円</p> <p>◆7月7日 実施方針の公表 (BT+コンセッション方式)</p> <p>◆10月20日 入札公告</p> <p>◆11月24日 入札参加表明の受付</p> <p>◆3月29日 入札、提案書受付</p> <p>◆3月29日 入札不落(予定価格超過)</p> <p>◆4月3日 入札不落の公表</p> <p>【当初の計画】</p> <p>◇4月 落札者の決定及び公表</p> <p>◇7月 特定事業契約の締結</p> <p>◇設計・建設 (33か月)</p> <p>◇2027年4月 供用開始</p>					
今後のスケジュール (予定)	<p>◆4月～5月 民間事業者へのヒアリング、事業単位・事業手法の見直し 第1期として消防学校をBTO方式で整備</p> <p>◆[令和6年6月議会] 補正予算案の提出 (アドバイザー業務委託費 18,491 千円)</p> <p>◆7月～11月 事業費の検証、マーケットサウンディング※</p> <p>※ 以下のスケジュールは予定</p> <p>◇1月 実施方針の公表 (BTO方式)</p> <p>◇2月 入札公告</p> <p>◇3月 入札参加表明の受付</p> <p>◇7月 入札、提案書受付</p> <p>◇9月 落札者の決定及び公表</p> <p>◇12月 特定事業契約の締結</p> <p>◇設計・建設 (約3年)</p> <p>◇2028年度内完成</p> <p>第2期となる防災公園の整備に向けては、適切な事業手法を選択できるよう、迅速に作業を進める 現在着手している用地取得や造成等の進捗に影響はない</p>					

※ マーケットサウンディング…事業内容の見直し案を基に、市場性の有無や実現可能性、アイデア等を把握する目的で、参加事業者を募り、一定の時間の意見交換・対話を行う個別ヒアリング調査。
