

第 20 回アジア競技大会の開催に向けた検討状況及び今後の取組について

1 開催都市契約

平成 29 年 9 月としていた締結期限を実質的に 1 年間延長（平成 30 年 9 月）し、アジア・オリンピック評議会（OCA）と継続して協議中である。（OCA側も慎重な検討を行っており、今後も協議にある程度の時間がかかる見込み）

2 組織委員会

- ・平成 31 年度当初の組織委員会設立を目指し、平成 30 年度は組織委員会設立準備委員会（仮称。以下「準備委員会」という。）を設置し、組織委員会の組織・事業計画等を検討していく。
- ・準備委員会は、愛知県知事、名古屋市長、（公財）日本オリンピック委員会（JOC）、地元の経済団体、スポーツ団体を始めとする関係団体、県市両議員連盟の代表者等で組織する予定である。

3 大会開催基本計画

大会開催に向けて行うべき事項やスケジュールを分野ごとに示す「大会開催基本計画」の検討を行っており、平成 30 年度は、第 18 回アジア競技大会（以下「ジャカルタ大会」という。）にて現地調査を実施し、その結果を反映させる。

4 競技会場（詳しくは、別紙「第 20 回アジア競技大会 競技会場の検討状況一覧表」を参照）

- ・開催構想で示した候補会場について、市町村からの提案や競技団体の意向、新施設の整備計画を踏まえ、関係者と次のとおり調整中である。

《今回の変更》

- ・ 体育館で実施する競技については、新施設の整備計画の情報があるため、変更も含めて全て再調整中である。
- ・ テニス・ソフトテニスとボウリングについては、開催構想で示した会場に課題があるため、変更も含めて再調整中である。
- ・ 自転車競技（マウンテンバイク）については、開催構想では場所を特定せず名古屋市内としていたが、コースに必要な高低差、距離、路面の状況等を勘案し、小幡緑地を候補会場とする。
- ・ 自転車競技（ロードレース）については、開催構想で示した奥三河地域で会場計画や具体のコースを検討している。
- ・ ソフトボールについては、開催構想では安城市総合運動公園ソフトボール場及び刈谷球場としていたが、コスト削減を図るため安城市総合運動公園ソフトボール場の1会場に集約する。
- ・ 自転車競技（BMXレース）についても、コスト削減の観点から、変更も含めて再調整中である。

- ・ 平成30年度は、上記の検討・調整を継続するとともに、照明や電源など映像制作の観点からも、各候補会場が適切か否か等について検討・調整を行っていく。

5 選手村

[選手村後利用の検討]

- ・ メイン選手村となる名古屋競馬場跡地の将来のまちづくりを見据え、後利用基本構想を策定中である。
- ・ その一環として、民間事業者へのヒアリング・アンケートを実施した。進出可能性のある事業者は次のとおり。

区 分	意 見
住宅供給事業者	<ul style="list-style-type: none"> ・マンションは、100～200 戸程度が妥当（各社）。さらに分譲戸数を増やすためには、広い需要層を対象とすることが必要となる。 ・戸建住宅は、将来的にまちづくりが進められるという前提であれば、総数で 200 戸程度という目標値はあり得る。 ・当地区の住宅市場動向から、価格帯は低めの設定となる。
商業施設運営事業者	<ul style="list-style-type: none"> ・中規模の商業施設(数 ha 程度)、または生活利便施設（スーパーマーケット、クリニック、スポーツジム等を組み合わせた形態）の進出に関心がある。
プロスポーツ団体	<ul style="list-style-type: none"> ・サッカースタジアムやスポーツアリーナ(バスケットボール)等の候補地として関心がある。ただし、設置時期や費用面に対する行政支援の必要性などの課題がある。
医療法人 社会福祉法人等	<ul style="list-style-type: none"> ・介護老人保健施設の移転や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の設置について関心がある。
学校法人等	<ul style="list-style-type: none"> ・留学生宿舎や運動施設の設置に関心がある。 ・郊外の大学(学部)の移転先として関心はあるが、跡地処理が課題となる。
<p>《共通意見》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・港区のグランドデザインを描き、行政によるまちづくりの方向性を明確化し、駅周辺の開発等を進める必要がある。 ・進出にあたっては、当地区周辺の住環境や交通利便性の向上等の行政支援及び進出意欲の高まる土地価格または賃料等の条件設定が必要である。（こうした条件が不透明な段階では、具体の検討は困難） 	

- ・平成 30 年度は、進出意向のある民間事業者が参加する研究会での検討及び有識者による助言を受けながら、引き続き後利用の基本構想づくりを進める。

[選手村の検討]

- ・選手村から離れた競技会場については、選手村を分散させることを検討している。
- ・選手村分散のために利用できる施設として、ホテルや公共又は民間の研修所を調査したが、一部エリアでは、客室数や食事会場等の規模が不足している。
- ・今年度末までにメイン選手村及びその他の選手村の概ねの規模を設定し、平成30年度は、選手村としての施設配置や整備方法、ホテルや研修所の施設規模が不足するエリアにおける仮設施設の建設について検討していく。


6 広報・PR

- ・ポスター掲示、イベント出展、子ども用パンフレットの配布等を行ったほか、これまでの取組をわかりやすくお示しし、県民の皆様からご意見をいただけるよう、県市のホームページを改善した。
- ・平成30年度は、ジャカルタ大会を契機とした県内でのPRに加え、現地での各国のマスメディア等へのPRも実施する。

7 レガシー

平成30年度より、県市において、それぞれが大会に参画する主体として、大会を活用して残すべきレガシー及びレガシー実現に向けた取組について検討を行う。

開催までの取組予定

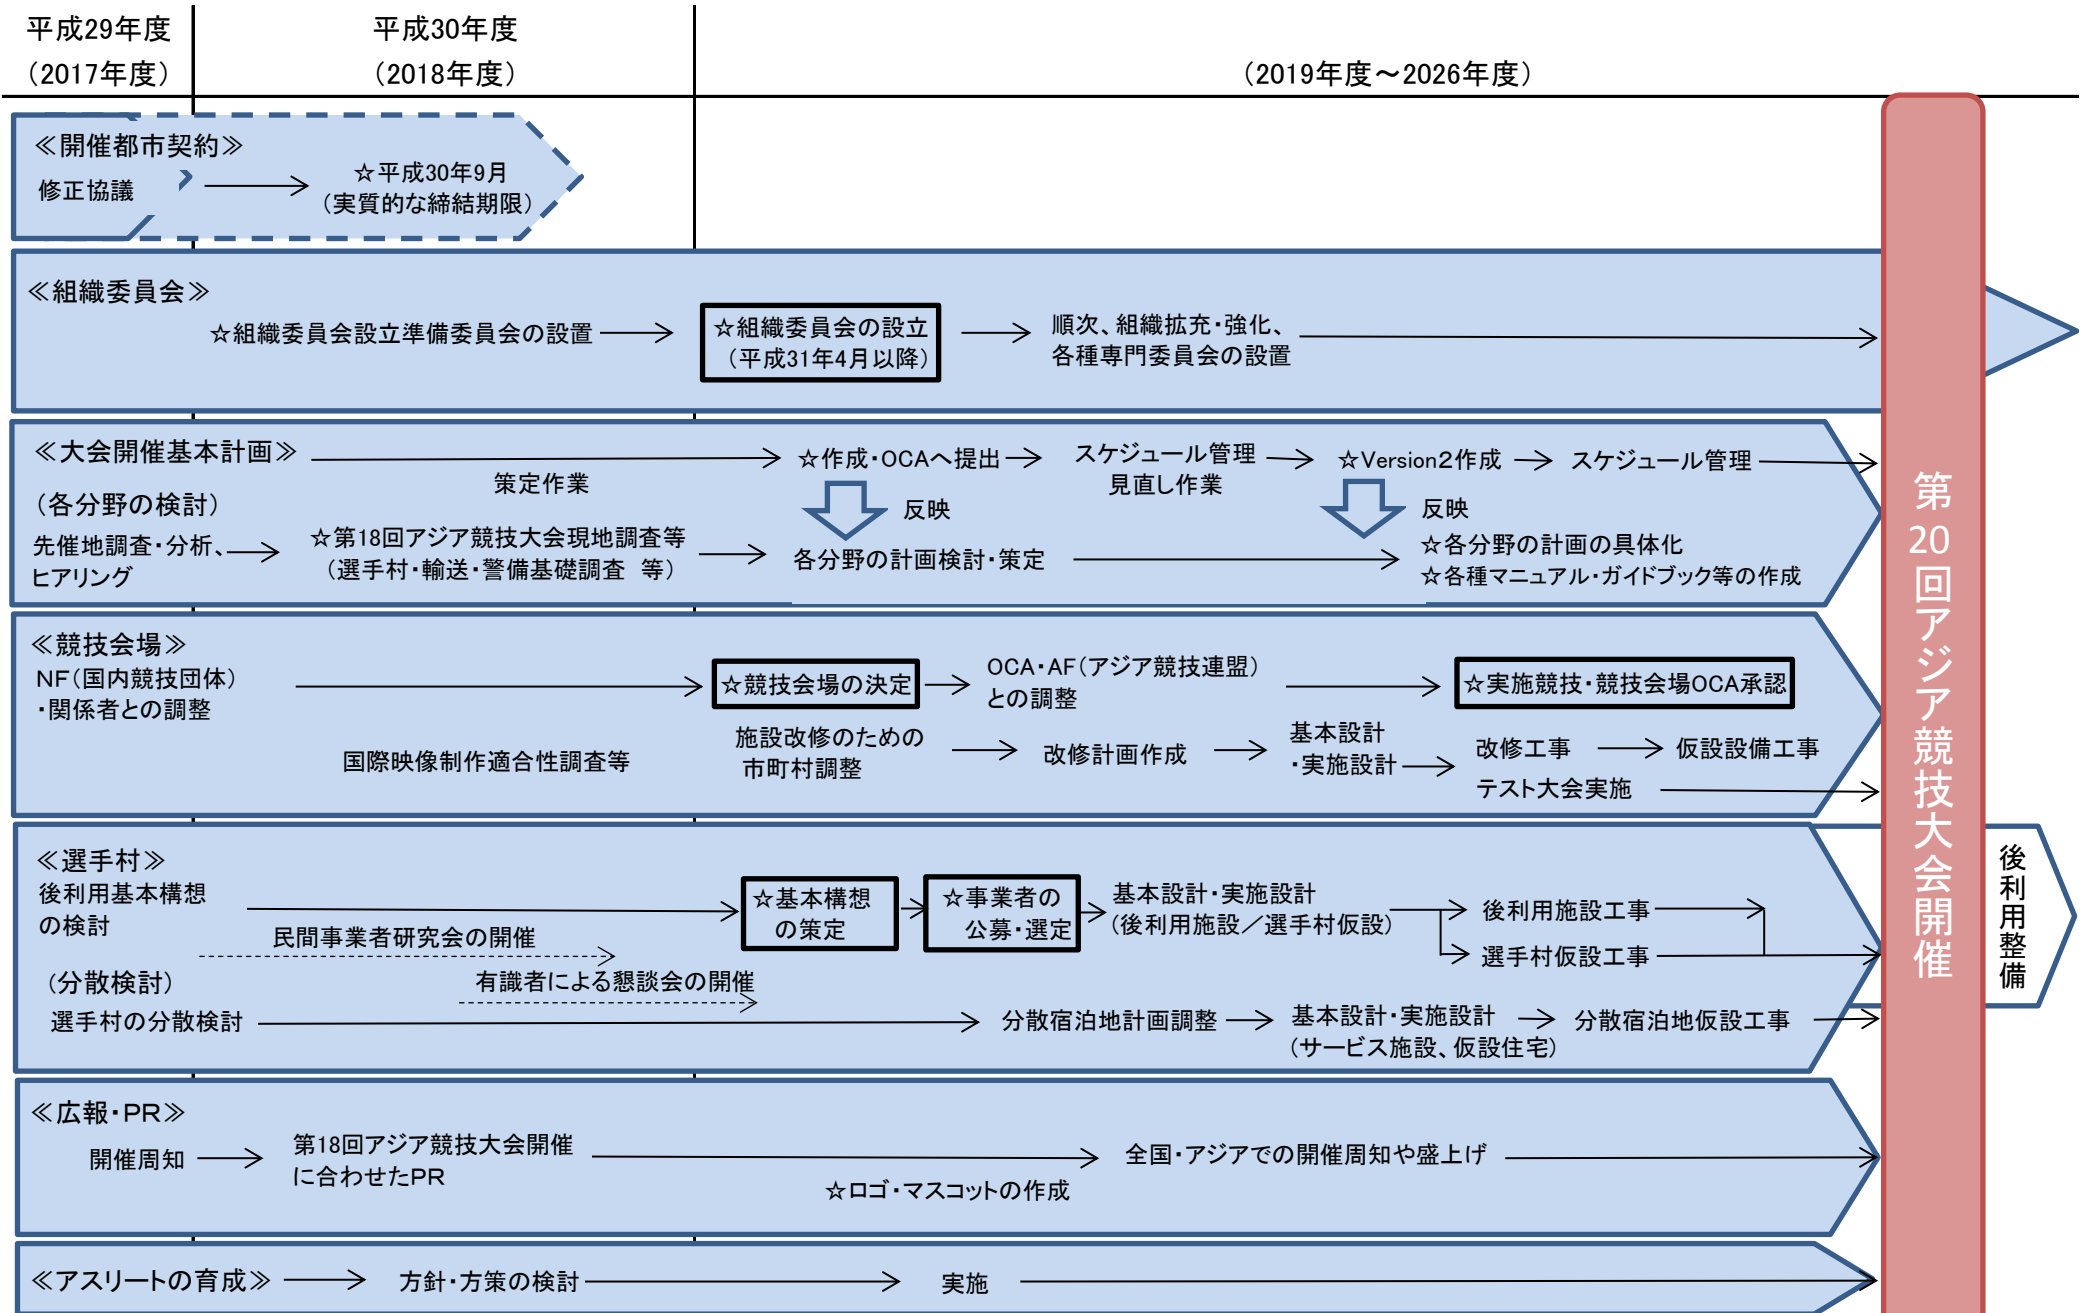

第20回アジア競技大会開催

後利用整備

第20回アジア競技大会 競技会場の検討状況一覧表

市町村からの提案や競技団体の意向、新施設の整備計画を踏まえ、関係者と調整中

競技／種別		候補会場（平成29年8月時点）	現在の調整状況
水泳	競泳／飛込み	① 名古屋市総合体育館(レインボープール)	左記会場で調整中
	シンクロナイズトスイミング	⑤⑩ 浜松市総合水泳場	
	水球	⑤⑪ サンフロッグ春日井	
アーチェリー		② 岡崎中央総合公園(多目的広場他)	左記会場で調整中
陸上競技	フィールド/トラック	③ 瑞穂公園陸上競技場	左記会場で調整中
	マラソン	③ 瑞穂公園陸上競技場(都心コース)	
	競歩	④ 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース	
バドミントン		⑤ ウイングアリーナ刈谷	会場変更も含めて再調整中
バスケットボール		⑥ 豊橋市総合体育館	会場変更も含めて再調整中
		⑦ 一宮市総合体育館	
ボクシング		⑧ 春日井市総合体育館	会場変更も含めて再調整中
カヌー・カヤック	スプリント	⑨ 長良川国際ポートコース(海津市、愛西市)	左記会場で調整中
	スラローム	⑩ 矢作川カヌースラロームコース(豊田市)	
	ボロ	⑪ 保田ヶ池(みよし市)	
自転車競技	トラックレース	⑫ 伊豆ベロドローム(伊豆市)	左記会場で調整中
	ロードレース	⑬ 奥三河地域	具体のコースを検討中
	マウンテンバイク	⑭ 名古屋市内	小幡緑地で調整中
	BMXレース	⑮ 愛知県国際展示場駐車場	会場変更も含めて再調整中
馬術		⑯ 愛知県森林公園	左記会場で調整中
フェンシング		⑰ 愛知県国際展示場	左記会場で調整中
サッカー		⑱ 豊田スタジアム	県外の会場も含めて再調整中
		⑲ 港サッカー場	
		⑳ 豊田市運動公園球技場	
		㉑ ウェーブスタジアム刈谷	
		㉒ 豊橋市民球技場	
ゴルフ		㉓ 愛知カンツリー倶楽部	左記会場で調整中
体操	体操／新体操／トランポリン	㉔ 名古屋市総合体育館(レインボーホール)	会場変更も含めて再調整中
ハンドボール		㉕ 武田テバオーシャンアリーナ	会場変更も含めて再調整中
		㉖ 名古屋市稲永スポーツセンター	

競技／種別		候補会場（平成29年8月時点）	現在の調整状況
ホッケー		㉗ 岐阜県グリーンスタジアム(各務原市)	左記会場で調整中
柔道		㉘ スカイホール豊田	会場変更も含めて再調整中
近代五種	ランニング&射撃/馬術	⑯ 愛知県森林公園	左記会場で調整中
	フェンシング	⑧ 春日井市総合体育館	
	水泳	⑤⑪ サンフロッグ春日井	
ボート		⑨ 長良川国際ポートコース(海津市、愛西市)	左記会場で調整中
ラグビー		㉙ 瑞穂公園ラグビー場	左記会場で調整中
セーリング		⑳ 海陽ヨットハーバー	左記会場で調整中
射撃	ピストル/ライフル/クレー	㉑ 愛知県総合射撃場	左記会場で調整中
卓球		㉒ 西尾市総合体育館	会場変更も含めて再調整中
テコンドー		㉓ 名古屋市枇杷島スポーツセンター	会場変更も含めて再調整中
テニス・ソフトテニス		㉔ 名古屋市東山公園テニスセンター	会場変更も含めて再調整中
トライアスロン		— 調整中	調整中
バレーボール	バレーボール	㉕ 愛知県体育館	会場変更も含めて再調整中
	ビーチバレーボール	㉖ パークアリーナ小牧	
ウエイトリフティング		㉗ (仮称)碧南緑地ビーチコート	左記会場で調整中
レスリング		㉘ 吹上ホール	左記会場で調整中
野球・ソフトボール	野球	㉙ 岡崎中央総合公園(市民球場)	左記会場で調整中
		㉚ 小牧市総合運動場野球場	
	ソフトボール	㉛ 安城市総合運動公園ソフトボール場	左記会場で調整中
		— 刈谷球場	
ボウリング		㉜ 稲沢グランドボウル	会場変更も含めて再調整中
クリケット		㉝ 愛・地球博記念公園野球場	左記会場で調整中
カバディ		㉞ 東海市民体育館	会場変更も含めて再調整中
マーシャルアーツ		㉟ 愛知県武道館	会場変更も含めて再調整中
セパタクロー		㊱ (仮称)瑞穂公園体育館	会場変更も含めて再調整中
スポーツクライミング		㊲ ポートメッセなごや	左記会場で調整中
スカッシュ		㊳ 愛知県国際展示場	左記会場で調整中

※ 網掛けは、資料中の「今回の変更」の記載に関連する候補会場

第20回アジア競技大会 競技会場マップ

